

Projekta „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”

LIFE Waste To Resources IP / LIFE20 IPE/LV/000014

PROJEKTA MONITORINGA PLĀNS UN PROGRAMMA (D1 AKTIVITĀTE)

| | |
|---|--|
| Aktivitātes nosaukums un numurs | D1 aktivitāte Projekta rezultātu un metožu ietekmes monitorings |
| Noddevuma nosaukums projektā | Monitoringa plāns un programma |
| Sasniedzamā rezultāta izpildes termiņš | 31.12.2022. |
| Noddevuma iesniegšanas datums | 31.01.2023. |
| Versija | 1.0. |

2023.gads

D1 aktivitātes mērķis ir veidot ietvaru un nodrošināt projekta aktivitāšu un papildinošo aktivitāšu rezultātu tehnisko monitoringu, iekļaujot monitoringu par demonstrācijas un pilotaktivitāšu izpildes rādītājiem, kapacitātes stiprināšanas un izpratnes veicināšanas pasākumiem, kā arī novērtēt projekta ieguldījumu Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.-2028.gadam un Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas īstenošanā. Katra no apakšaktivitātēm ir paredzēta noteikta uzdevuma īstenošanai.

Uzraudzība ir viena no galvenajām projekta sastāvdaļām un tas ir efektīvākais veids, lai izsekotu aktivitāšu īstenošanas gaitai. Monitorings nodrošina regulāru, vispusīgu veidu, kā analizēt dažādu īstenoto aktivitāšu atbilstību un ietekmi un laicīgi veiktu korekcijas projekta aktivitātēs, ja monitoringā tiek konstatētas novirzes no plānotā. Monitoringa rezultāti ļaus norādīt veiksmīgākos un izmaksu ziņā efektīvākos risinājumus atkritumu apsaimniekošanas sistēmas turpmākai pilnveidošanai un atkritumu samazināšanai. Monitorings ir svarīgs, lai nodrošinātu efektīvu visu aktivitāšu uzraudzību un nodrošinātu, ka Projekta mērķi tiek sasniegti un rada vēlamu ietekmi.

D1.1. Monitoringa plāna izstrāde

Ganta tabula aktivitāšu izpildes uzraudzībai

Nemot vērā projekta apjomu aktivitāšu, sasniedzamo rezultātu un iesaistīto partneru skaita ziņā, projekta īstenošanas uzraudzībai ir izveidota *Ms Excel* Ganta tabula (1.pielikums angļu valodā). Šajā tabulā ir apkopota informācija par projekta aktivitāšu, apakšaktivitāšu laika grafiku un sasniedzamo rezultātu (*deliverables*) un starprezultātu (*milestones*) plānoto izpildes termiņu. Šī tabula tiks izmantota projekta vadības ikdienas darbam, atspoguļojot arī aktivitāšu, apakšaktivitāšu faktisko laika grafiku un sasniedzamo rezultātu un starprezultātu faktisko izpildes termiņu. Šis rīks sniedz vispusīgu un pārskatāmu informāciju par esošo situāciju un progresu.

Ganta tabulas aizpildīšanu nodrošina projekta vadošais partneris – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM), balstoties uz projekta partneru ceturkšņa atskaitēm un savstarpēji saskaņotu informāciju ar projekta partneriem.



1.att. Ms Excel Ganta tabulas skats

Projekta saturiskie nodevumi (*deliverables/ milestones*)

Projekta ietvaros VARAM kopā ar ceturkšņa tehniskajām (saturiskajām) atskaitēm veic uzskaiti un fiksē projektā sasniegto rezultātu (*deliverables/ milestones*) iesniegšanu (2.pielikums angļu valodā), noteikto izpildes termiņu ievērošanu, kā arī izvērtē to atbilstību projekta aprakstam un mērķim. VARAM sniedz atgriezenisko saiti projekta partneriem par iesniegtajiem rezultātiem jeb nodevumiem. Saskaņoti nodevumi tiek publicēti projekta tīmekļvietnē wastetoresources.varam.gov.lv sadaļā "Rezultāti". Gadījumā, ja VARAM sniedz atgriezenisko saiti par nodevumu ar komentāriem, projekta partnera pienākums ir veikt atbilstošus labojumus un iesniegt labotu versiju.

Projekta finansiālās izpildes progress


Šajā monitoringa plānā ir iekļauta *Ms Excel* tabula par katras aktivitātes finansiālās izpildes progresu (3.pielikums angļu valodā) aktivitāšu griezumā gan partneriem, gan projektā kopumā. Tabula tiks aizpildīta par katru gadu. Lai nodrošinātu projekta finanšu korektu izlietojumu, papildus aktivitāšu finansiālās izpildes progressa monitoringam tiek veikta finanšu uzskaitē un pārbaude ceturkšņa atskaišu veidā, nodrošinot izlietoto finanšu līdzekļu atbilstību LIFE programmas un Latvijas nacionālā līdzfinansējuma prasībām.

D1.2. Projekta demonstrācijas un pilotaktivitāšu rezultātu monitorings (tehniskais monitorings)

Projektā vairākās aktivitātēs tiks īstenotas demonstrācijas un pilotaktivitātes. Šajā monitoringa plānā *Ms Excel* tabulas veidā (4.pielikums angļu valodā) ir apkopoti visi pasākumi, tajos plānotie sasniedzamie rezultāti, galvenie izpildes indikatori, un atbildīgie projekta partneri par to īstenošanu. Informācija par demonstrācijām un pilotaktivitātēm tiks aizpildīta katru gadu, tādējādi nodrošinot visaptverošu informācijas apkopojumu un tās pieejamību. Informācija par monitoringa rezultātiem tiks publiskota projekta tīmekļvietnē wastetoresources.varam.gov.lv.

Risku un to novēršanas monitorings

Monitoringa plāns ietver arī risku identificēšanu un to mazināšanas iespēju novērtēšanas tabulu (5.pielikums angļu valodā). Riski tiek identificēti katrai projekta aktivitātei un norādīti šo risku mazināšanas pasākumi. Par katru risku tiek sniegts vērtējums, kāda ir riska iestāšanās iespējamība (zema, vidēja vai augsta) un kāda ir riska ietekme tā iestāšanās gadījumā (zema, vidēja vai augsta) (skatīt risku matricu 2.att.).

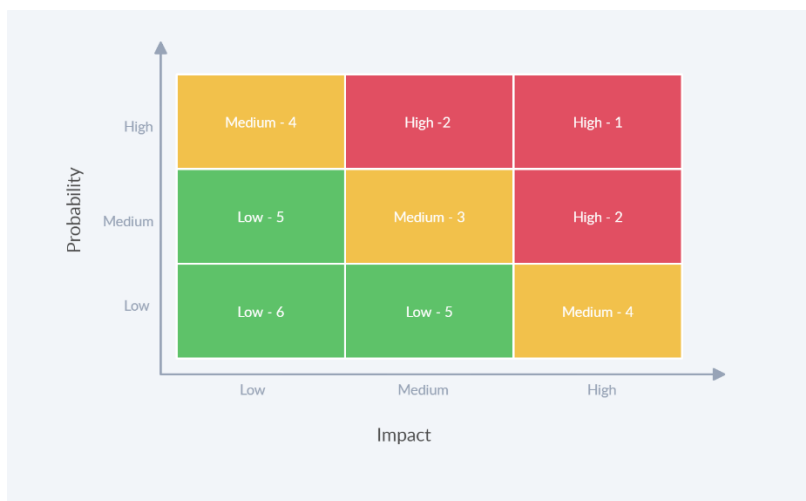

2.att. Risku matrica

Zems risks ar vērtību 5 – 6 (zaļā krāsā) nozīmē, ka tas ir ar nelielu iestāšanās varbūtību un mazu ietekmi. Risks ir pieņemams. Šādam riskam nav nepieciešamība obligāti definēt riska mazināšanas pasākumus un kontroles.

Vidējs risks ar vērtību 3 – 4 (oranžs) nozīmē, ka šim riskam iespējamas kombinācijas ar visu punktu riska iespējamības un ietekmes vērtībām. Risks ir gandrīz pieņemams. Risku kontrole ir pastiprināti jāuzrauga un ir nepieciešama risku mazināšanas pasākumu un kontroļu pilnveidošana.

Augsts risks ar vērtību 1 – 2 (sarkans) nozīmē, ka risks ir ar ļoti lielu iestāšanās iespējamību un būtisku ietekmi. Risks nav pieņemams. Nepieciešama rīcība riska mazināšanas pasākumu un kontroļu ieviešanai. Šie ir prioritāri riski, kuru mazināšanai jāparedz resursi un risinājumi to novēršanai.

D1.3. Kapacitātes stiprināšanas un izpratnes veicināšanas monitorings

Kapacitātes stiprināšanas un izpratnes veicināšanas monitoringa galvenais mērķis ir izvērtēt projekta un papildinošo aktivitāšu ietekmi, kas ietver gan zināšanu stiprināšanu, uzlabotu sadarbību un jaunu zināšanu pielietojumu. Tāpēc šajā monitoringa plānā *Ms Excel* tabulā (pielikums Nr.6 latviešu valodā) ir iekļauti visi projekta pasākumi, kuru mērķis ir stiprināt kapacitāti, un uzlabot sabiedrības un dažādu iesaistīto grupu zināšanas, īstenojot seminārus, darba grupas, konferences, sabiedrības informēšanas kampaņas, apmācības un cita veida pasākumus. Sasniegtie rezultāti tiks vērtēti pēc kvantitatīviem rādītājiem, salīdzinot tos pret projektā plānotā.

Papildus augstāk minētajam projektā aktivitāšu īstenotāji nodrošinās anketēšanu pasākumos, lai novērtētu katra pasākuma radīto ietekmi attiecībā uz zināšanu uzlabošanu, ieradumu un attieksmes maiņu vai vēlmi mainīt ikdienas ieradumus pirms-pēc pasākuma īstenošanas. Projektā visiem partneriem tiks nodrošināta veidlapa, kurā iekļauti standartizēti jautājumi anketēšanai un kurus pasākumu īstenotāji var pielāgot atbilstoši pasākuma tēmai.

Papildus šajā tabulā tiks uzskaitītas iesaistītās puses, kuras tiek sasniegtas ar projektā īstenotām konsultatīvām programmām, jo īpaši ar industriālās simbiozes platformu. Tāpat arī tiks vērtēta iesaistīto pušu atsaucība pieteikties finansiālam atbalstam un arī atbalstu saņēmušo iesaistīto pušu skaits.

D1.4. Projekta ieguldījuma monitorings Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.-2028.gadam un Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas īstenošanā

Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāns 2021.-2028.gadam paredz pasākumus, kur daļa no tiem tiek īstenota projekta ietvaros. Šī monitoringa plāna uzdevums ir nodrošināt projekta pasākumu (7.pielikums latviešu un angļu valodā) un papildinošo aktivitāšu īstenošanas monitoringu, jo projektam kopumā ir jānodrošina Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.-2028.gadam (turpmāk – VAAP2028) īstenošanu pilnā apmērā un Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas mērķu īstenošanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 22.janvāra rīkojuma Nr.45 "Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam" 4.punktu, VARAM uzdots sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvos ziņojumus par VAAP2028 izpildi šādos termiņos:

- 1) līdz 2024. gada 1. oktobrim par izpildi 2021., 2022. un 2023. gadā;

- 2) līdz 2027. gada 1. oktobrim par izpildi 2024., 2025. un 2026. gadā;
- 3) līdz 2029. gada 1. oktobrim par izpildi 2027. un 2028. gadā.

Nemot vērā noteiktos termiņus informatīvo ziņojumu sagatavošanai, VARAM ik gadu apkopos informāciju par projekta papildinošo aktivitāšu īstenošanas progresu, bet izpildes rādītāji tiks apkopoti augstāk minēto informatīvo ziņojumu ietvaros.

Lai nodrošinātu vispusīgu projekta un papildinošo aktivitāšu ieguldījuma novērtējumu, monitoringa plānā ir iekļauta arī projekta un papildinošo aktivitāšu galveno izpildes indikatoru tabula (8.pielikums angļu valodā). Projekta D4 aktivitātē "LIFE projekta galveno indikatoru monitorings" paredz definēt un ziņot par galveno projekta izpildes indikatoru progresu, kas tiek veikts tiešsaistes režīmā datu bāzē (projekta vidus posmā un projekta beigās) (skat.3.attēlu). Lai nodrošinātu regulāru izpildes indikatoru progresa uzraudzību, tabulā (8.pielikumā) ir norādīti atbildīgie projekta partneri par indikatoru izpildes ziņošanu. Dati par projekta papildinošo aktivitāšu izpildes progresu tiek apkopoti pusotru gadu pēc pārskata beigām. Tāpēc to apkopojums būs pieejams ar pusotra gada nobīdi. Savukārt projekta izpildes indikatoru būs pieejami īsākā termiņā – mēneša laikā pēc kārtējā gada beigām, ko nodrošina projekta partneri.

| Reference | Title | Acronym | Beneficiary | Status | Last Data Snapshot |
|----------------------|--|----------------------------|---|----------|--|
| LIFE20 IPE/LV/000014 | Waste To Resources Latvia – boosting regional sustainability and circularity | LIFE Waste To Resources IP | The Ministry of Environmental Protection and Regional Development | VERIFIED | Snapshot ENV-Waste - First report - 2018 |

3.att. Projekta galveno izpildes indikatoru tiešsaistes datu bāzes skats

C11 Projekta demonstrācijas un pilotaktivitāšu pārneses pasākumu rezultātu monitorings

Projekta C11 aktivitātē "Projekta pārneses un atkārtojamības stratēģijas izstrāde un īstenošana" paredz uzraudzīt Projekta demonstrācijas un pilotaktivitāšu pārneses rezultātus. Pārneses pasākumi ir iekļauti Projekta pārneses un atkārtojamības stratēģijas rīcības plānā, kuri iekļauti *Ms Excel* tabulas veidā (4.pielikuma 2.izklājlapā angļu valodā). Katram pārneses pasākumam ir norādīts atbildīgais partneris, sasniedzamais rezultāts un izpildes termiņš, kā arī finanšu avots, no kura plānots finansēt attiecīgos pārneses pasākumus. Informācija par pārneses pasākumu izpildi tiks aizpildīta katru gadu, tādējādi nodrošinot visaptverošu informācijas apkopojumu un rezultātu izpildes uzraudzību.

Projekta monitoringa tabulu pārskata periodi un datu iesniegšanas termiņi

| Nr.p.k. | Tabulas nosaukums | Atbildīgais par aizpildīšanu | Pārskata periods, par kuru aizpilda tabulu | Tabulas aizpildīšanas termiņš |
|---------|--|--|---|---|
| 1. | Ganta tabula | VARAM | par iepriekšējo ceturksni | 1 mēneša laikā pēc kārtējā ceturkšņa beigām |
| 2. | Sasniedzamo rezultātu tabula (<i>deliverables / milestones</i>) | VARAM | par iepriekšējo ceturksni | 1 mēneša laikā pēc kārtējā ceturkšņa beigām |
| 3. | Finansiālās izpildes progresa tabula | VARAM | par iepriekšējo gadu | 1 mēneša laikā pēc kārtējā gada beigām |
| 4. | Projekta demonstrāciju un pilotaktivitāšu rezultātu monitoringa tabula | visi partneri, kas īsteno pilotaktivitātes un demonstrācijas | par iepriekšējo gadu | 1 mēneša laikā pēc kārtējā gada beigām |
| 5. | Risku un to novēršanas monitoringa tabula | visi partneri | aktualizē katru gadu | 1 mēneša laikā pēc kārtējā gada beigām |
| 6. | Kapacitātes stiprināšanas un izpratnes veicināšanas monitoringa tabula | visi partneri | par iepriekšējo pusgadu | 1 mēneša laikā pēc kārtējā pusgada beigām |
| 7. | Monitoringa tabula par projekta ieguldījumu Valsts atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.-2028.gadam un Atkritumu apsaimniekošanas direktīvas īstenošanā | VARAM | par izpildi 2021., 2022. un 2023. gadā; par izpildi 2024., 2025. un 2026. gadā; par izpildi 2027. un 2028. gadā | līdz 2024. gada 1. oktobrim; līdz 2027. gada 1. oktobrim; līdz 2029. gada 1. oktobrim |
| 8. | Projekta un papildinošo aktivitāšu galveno izpildes indikatoru tabula | visi partneri | projekta izpildes indikatori - par iepriekšējo gadu; papildinošo aktivitāšu indikatori | 1 mēneša laikā pēc kārtējā gada beigām; 1,5 gada laikā pēc kārtējā gada beigām |
| 9. | Projekta demonstrāciju un pilotaktivitāšu pārneses pasākumu rezultātu monitoringa tabula | visi partneri, kas īsteno pilotaktivitātes un demonstrācijas | par iepriekšējo gadu | 1 mēneša laikā pēc kārtējā gada beigām |

LIFE integrētais projekts "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (*LIFE Waste To Resources IP*, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras. www.wastetoresources.varam.gov.lv

Šī informācija atspoguļo tikai *LIFE Waste To Resources IP* projekta partneru viedokli, un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.
